



Calendarios de ejecución de programas y proyectos

Febrero 2019

DGA
ADUANAS

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación
Planes, Programas y Proyectos



Soluzio Carbonell

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Proyecto Plan de Carrera de RR. HH.



Alcance:

Plan de carrera es la reestructuración de la gestión de recursos humanos , el cual incluye en su 1era. fase diseño e implementación de modelo de competencias, manual de descripciones y perfiles de puestos, diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño y actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos

Alineación Estratégica:

OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

Responsable:

Yojani J. López J., Gerencia RRHH

Avance Total: 40%

Inicio:11/1/2018 **Fin:**21/04/2020

Presupuesto

RD\$1.5MM

Áreas Involucradas

Gerencia de RRHH
Gerencia de Desarrollo Institucional
Ministerio de Administración Publica (MAP)



Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Proyecto Aduanas Móvil

Alcance:

Con la aplicación Aduanas Móvil los aforadores podrán introducir los cambios hallados durante la inspección física de las declaraciones en el momento en que ocurra el aforo, les permitirá visualizar los documentos adjuntos y tomar fotos de la carga inspeccionada de ser necesario.

En cuanto a la recepción de la carga, permitirá hacer la búsqueda por número de solicitud y por carta de ruta, validará que las solicitudes de traslados estén en estado de Transporte y se podrá recibir carga de forma parcial.



Alineación Estratégica:

OE.1 Ser un ente facilitador del comercio exterior.

Responsable:

Luz Del Carmen, Sanchez, Tecnología

Avance Total: 46%

Inicio:21/12/2017 **Fin:**28/12/2018

Presupuesto

RD\$5.2MM

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología
Subdirección Operativa

Gerencia Desarrollo Institucional

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Proyecto Aduanas Móvil

Actividades	dic-17	Ene - Mar 18	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	Ene-Mar 19
Aduanas Móvil		43%				
Definición de requisitos		100%				
Diseño		100%				
Preparación de ambientes		100%				
Desarrollo			91%			
Pruebas de Integración Desarrollo/Solvex			12%			
Implementación y Pruebas Calidad DGA - QATI			0%			
Configuraciones y parámetros (Matriz de Perfiles)			55%			
UAT - Certificación del Usuario				0%		
Preparación de dispositivos móviles				0%		
Evaluación de redes conexiones wifi				0%		
Entrenamiento de los Usuarios DGA App Móvil				0%		
Implementación en producción				0%		
Despliegue App móvil y central				0%		
Políticas y Procedimientos			67%			
Manuales			6%			
Entrenamiento		74%		0%		
				0%		
					0%	

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



Handwritten signature or initials in blue ink.

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Proyecto Atención al Usuario



Alcance

1. Creación de herramienta tecnológica para la trazabilidad de las solicitudes de servicios
2. Remodelación lobby Sede Central
3. Creación de formularios para la solicitud de servicios

Alineación Estratégica:

OE.4 Asegurar la calidad de los servicios.

Responsable

Jeannette Del Risco

Avance:

Fase 1

Inicio:01/01/2018 **Fin:** 30/12/2018

Herramienta Tecnológica

90%

Remodelación Lobby

50%

Fase 2

Inicio:01/01/2019 **Fin:** 30/12/2019

Creación de formularios para la solicitud de servicios 0%

Presupuesto

RD\$4MM

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología

Gerencia de Recursos Humanos

Consultoría Jurídica

Gerencia de Comunicaciones

Gerencia Administrativa

Gerencia Desarrollo Institucional

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Proyecto Atención al Usuario

Actividades	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 19	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19
Herramienta Tecnológica	90%						
Remodelación Lobby	50%						
Creación de formularios para la solicitud de servicios				10%			



SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Proyecto Exportador Autorizado

Alcance

Creación de mecanismos para otorgar los beneficios, contemplados en el Artículo 22 del Protocolo I del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre los Estados del Cariforum y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros" (EPA por sus siglas en inglés), bajo la categoría de **Exportador Autorizado** el exportador podrá bajo esta modalidad agilizar los trámites aduaneros y la disminución de sus costos, pues permite que una empresa dominicana califique como Exportador Autorizado a efectos de Origen, extendiendo una Declaración en Factura en lugar de emitir un Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1, para sus exportaciones a países de la Comunidad Europea.

Alineación Estratégica:

OE.1 Ser un ente facilitador del Comercio Exterior

Responsable

Joaquín Lopez, Dpto. Norma de Origen

Avance Total:

Fase 1	Inicio: 01/04/2018	Fin: 21/09/2018
Creación de la figura del exportador autorizado	100%	
Fase 2	Inicio: 01/01/2019	Fin: 30/12/2019
Herramienta Tecnológica creación código en SIGA	0%	

Presupuesto

RD\$0

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología	Consultoría Jurídica
Gerencia de Comunicaciones	Gerencia Desarrollo Institucional

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Proyecto Exportador Autorizado

Actividades	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 2019	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19
Fase 1	100%						
Levantamiento de Información	100%						
Análisis de requerimiento	100%						
Elaboración Documento de requerimiento	100%						
Documentación		100%					
Resolución para el Exportador Autorizado		100%					
Formulario Exportador Autorizado		100%					
Proceso Figura Exportador Autorizado		100%					
Fase 2							
Desarrollar aplicación				0%			
Realizar prueba				0%			
Pase a Producción					0%		
Campaña de Difusión						0%	



SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Reformas y Transformación de la Aduana RD



Alcance

Dotar a la institución de una herramienta tecnológica moderna para cumplir con los siguientes objetivos:

- ✓ Reducción del tiempo de despacho, eficientizando la labor de aforo.
- ✓ Mayor control de la carga.
- ✓ Reducción del ilícito, por mayor capacidad de análisis.

Alineación Estratégica:

OE.2 Recaudar y gestionar de manera eficiente

OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

Responsable Jean Charles de Mondesert, Tecnología



50

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Reformas y Transformación
de la Aduana RD

Presupuesto

A determinar

Áreas Involucradas

Sub-Dirección Tecnología

Sub-Dirección Técnica

Sub-Dirección Operativa

Gerencia Planificación Estratégica y Análisis Económico

Inteligencia Aduanera

Sub-Dirección De Zonas Francas

Gerencia de Comunicaciones



Proyectos identificados que ahora están dentro de este proyecto:



Proyecto de mejora del proceso de declaración y aforo



Mejora de la Gestión de Riesgo



Calidad de la data



Mejora del proceso de exportación

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos




SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 28 febrero 2019.

Reformas y Transformación de la Aduana RD

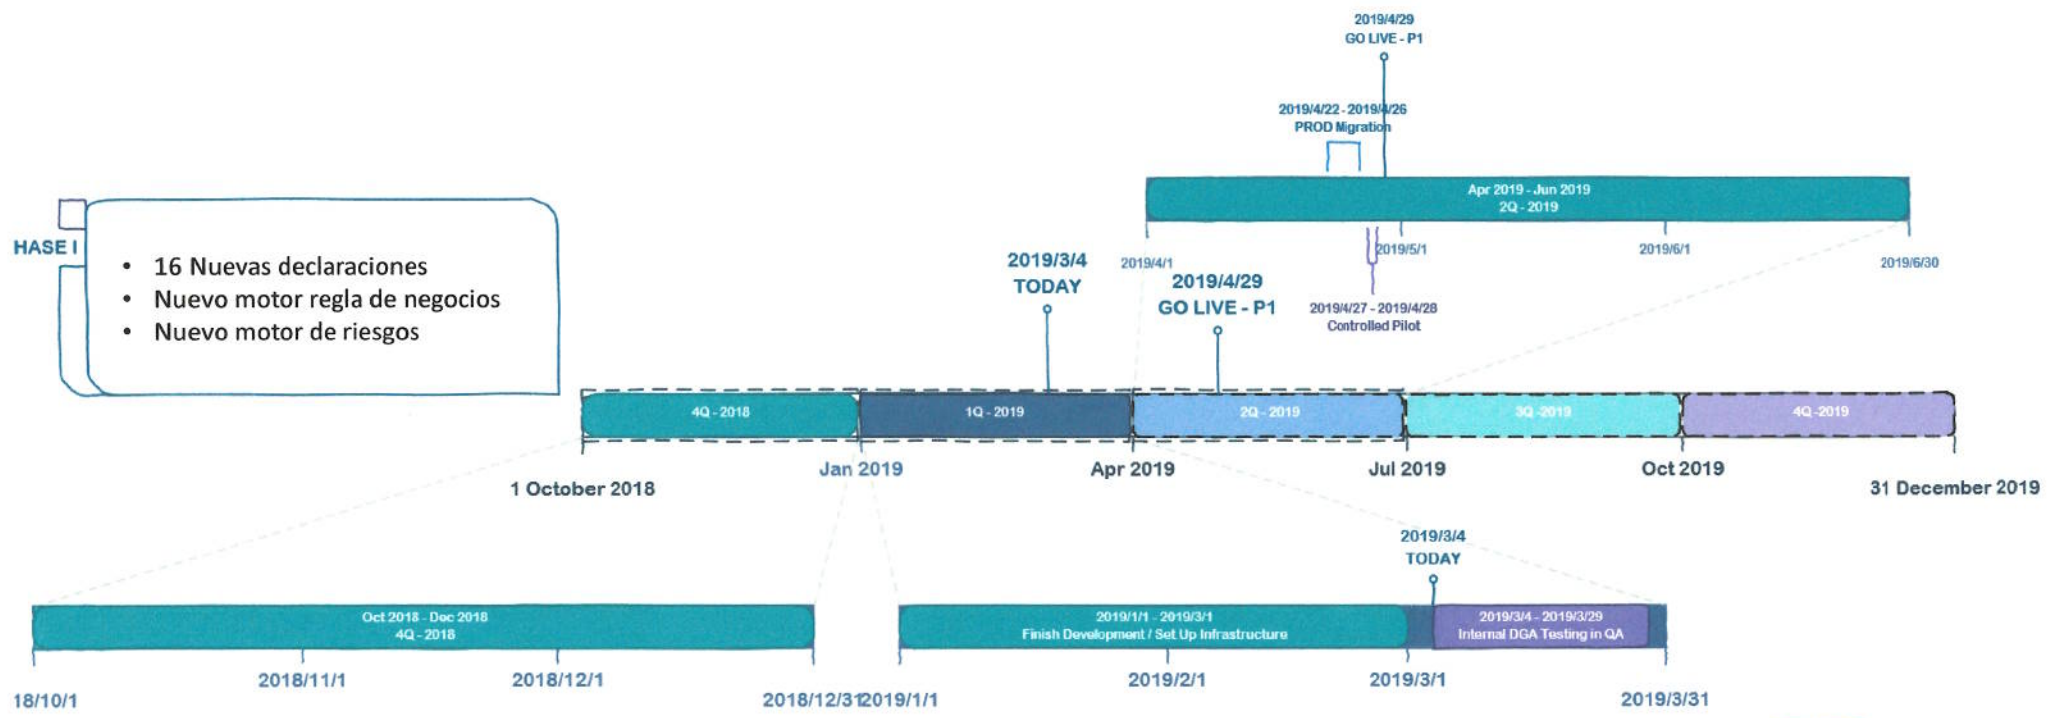


Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



50

CIERRE POA 2018 OCTUBRE-DICIEMBRE

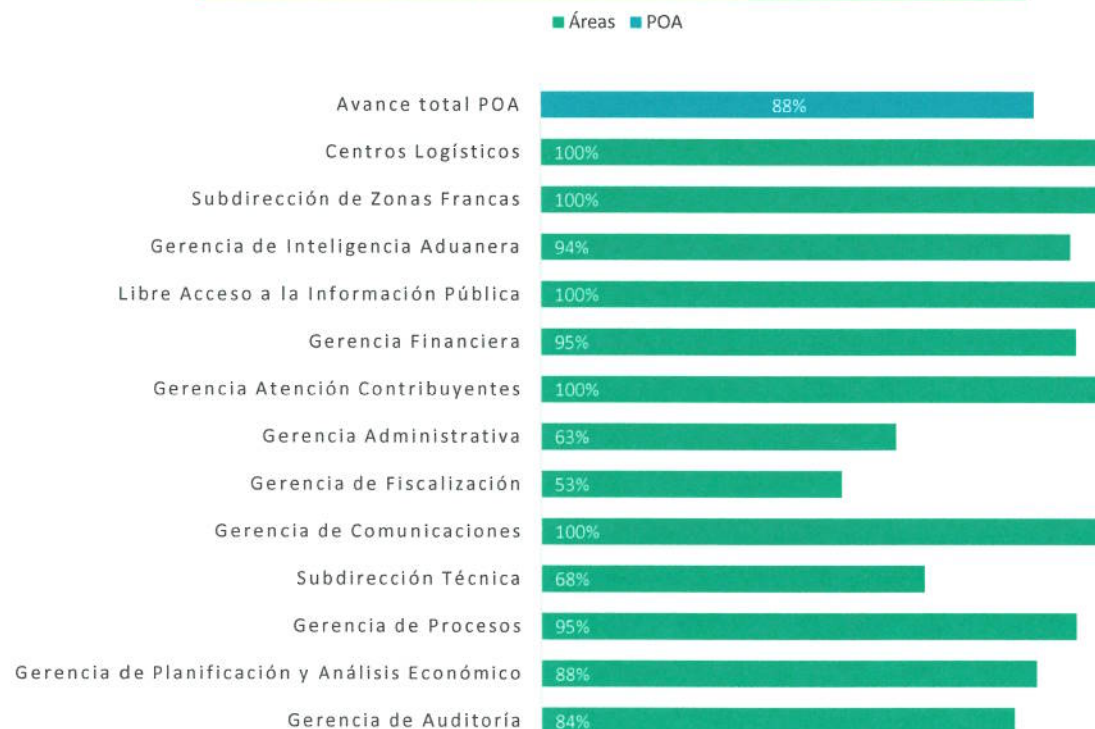

Promedio
General
88%



50
